



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԵՐԱՀՍԿԻՉ ՊԱԼԱՏԻ
ԽՈՐՀՈՒԹՅ

ՈՐՈՇՈՒՄ

2012թ. ծարդի 7 - ի թիվ 5/3

ՀՀ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ «ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾԵՐԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՎԵՐԱՀՍԿՄԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ՝ ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՄԻՋԱՋԳԱՅԻՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՏՐԱՄԱԴԱՐՎԱԾ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԵՎ ԴՐԱՄԱՆԱՐԴԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄՔ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ՎԵՐԱՀՍԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԸՆԹԱՑԻԿ ՀԱՃՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՍԱՍԻՆ

Դեկապրելով «Վերահսկիչ պալատի մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 10-րդ մասի գ) կետի պահանջով՝ ՀՀ վերահսկիչ պալատի խորհուրդը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Ե.

Հաստատել ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության «Գյուղական տարածքների տնտեսական գարգացման ծրագրի վերահսկման և կառավարման գրասենյակ» պետական եխմնարկի կողմից իրականացվող՝ օտարերկրյա պետությունների և միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից տրամադրված վարկային և դրամաշնորհային ծրագրերի նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ ընթացիկ հաշվետվությունը՝ համաձայն հավելվածի:

ՀՀ ՎԵՐԱՀՍԿԻՉ ՊԱԼԱՏԻ
ՆԱԽԱՐԱՐ

Ի. ԶԱՔԱՐՅԱՆ



Հայելպած
Հաստատվել է ՀՀ ՎՊ Խորհրդի
2012թ. մարտի 7-ի թիվ 5/3 որոշմամբ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿԻՉ ՊԱԼԱՏ

«Գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման ծրագրի վերահսկման և կառավարման գրասենյակ» պետական հիմնարկի կողմից իրականացվող՝ օտարերկրյա պետությունների և միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից տրամադրված վարկային և դրամաշնորհային ծրագրերի նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ

ԸՆԹԱՑԻԿ ՀԱԾՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Վերահսկողության հիմքը. ՀՀ վերահսկիչ պալատի խորհրդի 2011թ. սեպտեմբերի 28-ի թիվ 25/3 և 2011թ. դեկտեմբերի 23-ի թիվ 33/7 որոշումները:

Վերահսկողության նպատակը. «Գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման ծրագրի վերահսկման և կառավարման գրասենյակ» պետական հիմնարկի (այսուհետ՝ ԾԻԳ) կողմից իրականացվող՝ օտարերկրյա պետությունների և միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից տրամադրված վարկային և դրամաշնորհային միջոցների օգտագործման ուսումնասիրությունը:

Վերահսկողության առարկան. ԾԻԳ-ի կողմից ծրագրերի իրականացմանն ուղղված գործարքներն ու ընթացակարգը:

Վերահսկողության օբյեկտները. «Գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման ծրագրի վերահսկման և կառավարման գրասենյակ» պետական հիմնարկ և ծրագրերի իրականացմանն առնչվող այլ սուբյեկտներ:

Վերահսկողության կատարման ժամկետը. 2011 թ. հոկտեմբերի 6-ից մինչև 2012 թ. մարտի 1-ը;

Վերահսկողությամբ բնորդված ժամանակահատվածը. 2008 թ. հունվարի 1-ից մինչև 2011 թ. դեկտեմբերի 31-ը;

Վերահսկողության մեթոդաբանությունը.

Վերահսկողության իրականացման ընթացքում կիրառվել է դիտարկման, ստուգման և վերլուծության ձևը, ինչպես նաև՝ համապատասխանության, կատարողական և ֆինանսական վերահսկողության տեսակները:

Դիտարկման փուլում և ստուգման ընթացքում իրականացվել է ծիգ-ից, ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեից ստացված տեղեկատվության ուսումնասիրություն: Ստուգման ընթացքում կիրառվել են ընտրանքի, տարբեր տվյալների (քանակական և որակական) համադրման/համեմատման մեթոդներ, կատարվել է տարբեր փաստաթղթերի և տվյալների ուսումնասիրություն, ինչպես նաև՝ շինարարական աշխատանքների հսկչափագրման աշխատանքներ:

Վերլուծության փուլում ամփոփվել, վերլուծվել են դիտարկման և ստուգման ընթացքում արձանագրված փաստերը:

Վերահսկողության ժայռը՝

Վերահսկողությամբ ընդգրկվել է «Շուկայավարման հնարավորություն Փերմերմերին» ծրագիրը: Վերահսկողությամբ ընդգրկված ժամանակաշրջանում կատարվել է 10,400.53 մլն դրամի փաստացի վճարում, որից վերահսկողություն իրականացվել է 5,339.03 մլն դրամի նկատմամբ:

Վերահսկողության արդյունքները՝

1. «Շինարարական աշխատանքներ»

Ընտրանքային կարգով ստուգվել է թվով 20 օրյեկտ, ստուգված գումարը կազմել է 971,069.5 հազ. դրամ: **Ստուգման արդյունքում արձանագրվել է 104,914.9 հազ. դրամի խախտում, որից՝**

- ծավալային հավելագրում՝ 53,725.2 հազ. դրամ,
- անորակ աշխատանքներ՝ 51,189.7 հազ. դրամ:

Ընտրանքային կարգով ստուգված օրյեկտների գերակշիռ մասում բազմից կրկնվում են հետևյալ բնութագրական խախտումները.

- նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում բացակայում է շինարարության կազմակերպման նախագիծը,
- կոնստրուկտորական գծագրերը կատարվել են թերի՝ բացակայում են կտրվածքները, հանգույցների մանրամասենրը և այլն,
- խախտվել է ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2006թ. նոյեմբերի 29-ի թիվ 273-Ն «Շնակելի և հասարակական նշանակության շենքերի, շինությունների նախագծային փաստաթղթերի կազմը և բովանդակությունը սահմանող կանոններ» հրամանի պահանջները,
- նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի նախահաշվային մասերը փորձաքննություն չեն անցել,

- խախտվել են «Զաղաքաշինական փաստաթղթերի փորձաքննության կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 02.02.2002թ. թիվ 96 որոշման պահանջները,
- խախտելով սահմանված կարգը՝ թերի կազմով փորձաքննություն անցած և դրական փորձագիտական եզրակացություն ստացած որոշ օբյեկտների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը համաձայնեցվել են պատկան մարմինների կողմից,
- շինարարության նորմերի ընդունման մասով թերի և սահմանված կարգի խախտումներով են լրացվել շինարարության վարման մատյաններն ու ծածկված աշխատանքների ակտերը:

Շինարարական աշխատանքները հիմնականում իրականացվել են ներքոնշյալ խախտումներով.

- հենասյուների հիմքերը բետոնացվել են առանց կաղապարամածի,
- խողովակաշարերի վրա չեն տեղադրվել նախագծով պահանջվող պողպատե ձևավոր մասերը (մետաղական խողովակի փոխսվող տրամագծի անցումներ, եռարաշխիչ մասեր),
- հենասյուները և խողովակաշարերը ներկված են անորակ,
- հենասյուների վրա տեղադրվող կիսախողովակի և գազատարի միջև պարանիտե միջադիրները չեն տեղադրվել,
- շինարարական օբյեկտներում սահմանված կարգով պահանջվող տեխնիկական հսկողությունն իրականացվել է թերի, սահմանված կարգի խախտումներով,
- խախտվել են ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 28.04.1998թ. թիվ 44 «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացնան հրահանգի» պահանջները,
- խախտվել են «Զաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի «ը» կետի պահանջները՝ սահմանված կարգով պահանջվող հեղինակային հսկողություն օբյեկտներում չի իրականացվել,
- ավարտված շինարարական օբյեկտի շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտերը հիմնականում կազմված են ՀՀ կառավարության 08.05.2003թ. թիվ 626-Ն «Ավարտված շինարարության շահագործման փաստագրման կարգը հաստատելու մասին» որոշման պահանջների խախտումներով:

Ծրագրի շրջանակներում իրականացվել են հանրապետության տարբեր համայնքների գազաֆիլկացման աշխատանքներ՝ ընդհանուր 66 ծրագիր: Բոլոր

ծրագրերով գազաֆիկացման աշխատանքներն ավարտված են, սակայն 2012թ. մարտի 1-ի դրությամբ **գազաֆիկացումից օգտվում են ընդամենը 4211 տնտեսություն՝ նախատեսված 18237-ի փոխարեն, կամ ընդամենը 23.1%-ը:**

Նմանատիպ ծրագրեր իրականացնելիս անհրաժեշտ է վեր հանել նման ցածր ցուցանիշի պատճառները և ծրագրերի պլանավորման փուլում ճիշտ գնահատել հետագայում դրանցից օգտվելու (օգտագործման արդյունավետությունը) հնարավորությունները:

2. «Ապրանքների ձեռքբերում»

Ուսումնասիրության արդյունքում արձանագրվել է՝

- «Արվա Երկիր» ՍՊԸ-ն շինարարական աշխատանքներն ավարտելոց հետո ԾԻԳ-ին պետք է վերադարձներ 992մ 630մմ տրամաչափի խողովակ, որը չի վերադարձվել: Ըստ ձեռքբերման արժեքի, խողովակների արժեքը կազմում է 11,408.0 հազ. դրամ:

- ԾԻԳ-ի և 3 կազմակերպությունների («Արամիր» ՍՊԸ, «Արշանդ» ՍՊԸ, «Վեստ Պլաստ Գրուպ» ՍՊԸ) միջև կնքվել են պ/է խողովակների ձեռքբերման պայմանագրեր, որոնց հիման վրա մատակարարված խողովակները տրամադրվել են տարբեր կապալառուներին: Սակայն, խողովակների բաշխումը կատարվել է թերի. հիմնականում բացակայում են խողովակների հանձնման ակտերը: Մասնավորապես՝ 1062մ (2,841.9 հազ. դրամ գումարով) պ/է խողովակների տրամադրումը կապալառուներին ԾԻԳ-ի կողմից չի հիմնավորվում, քեզ ում են տրված և որտեղ են տեղադրված:

- «Վեստ Պլաստ Գրուպ» ՍՊԸ-ի կողմից ԾԻԳ-ին մատակարարվել է նաև 3720մ մետաղապլաստ խողովակ՝ 1,265.6 հազ. դրամ գումարով: **ԾԻԳ-ում բացակայում է խողովակների բաշխումը՝ պարզ չէ՝ ում են տրված և որտեղ են տեղադրված:**

- ԾԻԳ-ի և «Վեստ Պլաստ Գրուպ» ՍՊԸ-ի միջև 2009թ.-ի ընթացքում կնքվել է 9 պայմանագիր՝ 56,342.2 հազ. դրամ արժեքով: Նշված պայմանագրերի շրջանակներում կրկնակի հաշվարկվել է ԱՀՀ՝ ընդհանուր 1,437.5 հազ. դրամ արժեքով, ուշ մատակարարված ապրանքների համար պետք է կիրառվի ընդհանուր 366.6 հազ. դրամի տույժ: «ՀՀ Սյունիքի մարզի Կոռոնիձոր համայնքի ջրամատակարարման նախարարության պոլիէթիլալյին խողովակների մատակարարում և մոնտաժ» աշխատանքների պայմանագրի մասով կապալառուի ընտրություն չի անցկացվել (այդ մասով ԾԻԳ-ում փաստաթուղթ առկա չէ):

- ՀՀ Շիրակի մարզի մի շարք համայնքների գազաֆիկացման աշխատանքների համար հայտարարված երեք մրցույթներին ամենացածր գնառաջարկը

Աերլայացրել է «Արտինժենիրինգ» ՍՊԸ-ն: Մրցութային հանձնաժողովը երկու պայմանագրերով հաղթող է ճանաչել «Արտինժենիրինգ» ՍՊԸ-ին: Երրորդ պայմանագրի դեպքում, հաշվի առնելով «Արտինժենիրինգ» ՍՊԸ-ի գրությունը, ըստ որի՝ կազմակերպությունը հրաժարվում է մրցույթից (շինաշխատանքները ժամանակին ավարտելու անհնարինության պատճառով), մրցութային հանձնաժողովը առաջարկել է այդ մրցույթի համար հաղթող ճանաչել հաջորդ հայտառություն՝ «Առվա-Երկիր» ՍՊԸ-ին:

Հայտառությունից կողմից մրցութային առաջարկից հրաժարվելու պարագայում ԾԻԳ-ի կողմից չի պահպել մրցութային առաջարկի բանկային երաշխիքը 1,000.0 հազ. դրամի չափով:

▪ Թվով 2 պայմանագրերով «Արտինժենիրինգ» ՍՊԸ-ին տրամադրվել է 200մմ տրամաչափի 12990մ պ/է խողովակ, աշխատանքների ընթացքում տեղադրվել է 12890մ-ը: *Sարքերությունը՝ 100մ, չի վերադարձվել ԾԻԳ-ին*, որի արժեքը 1մ-ի համար կազմում է 10,380.0 դրամ (*ընդամենը՝ 1,038.0 հազ. դրամ*):

▪ FMAP/LCB/CW/-2009/017 պայմանագրի շրջանակներում «Արտինժենիրինգ» ՍՊԸ-ին տրամադրվել է 200մմ տրամաչափի պ/է խողովակ, որից 65մ-ը նախատեսվել է խողովակների վթարային պահեստավորման համար: Սակայն, կատարողական ակտով կապալառուն ներկայացրել է 65մ գնված խողովակ, որի համար լրացուցիչ վճարվել է 1,220.7 հազ. դրամ՝ 1մ-ի համար 18,780.0 դրամ՝ այն դեպքում, եթե ԾԻԳ-ին մատակարարվող խողովակների 1մ-ի գինը 10,380.0 դրամ է: *Անհայտ է խողովակների գտնվելու վայրը:*

▪ FMAP/LCB/CW/-2009/019 պայմանագրով նույնպես նախահաշվով նախատեսվել է 60մ (200մմ տրամաչափի) և 36մ (160մմ տրամաչափի), խողովակների վթարային պահեստավորում, խողովակները ԾԻԳ-ի կողմից «Արտինժենիրինգ» ՍՊԸ-ին տրամադրվել են գրոյական արժեքով: *Անհայտ է խողովակների գտնվելու վայրը՝ 856.8 հազ. դրամ արժեքով:*

ԾԻԳ-ի և «Տրանսգազխ» ՍՊԸ-ի միջև կնքվել են 2 պայմանագրեր՝ 163,348.7 հազ. դրամ գումարով (ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի, Փոքր Սեպասար, Մեծ Սեպասար և Կրասար համայնքների գազաֆիլացում):

▪ Աշոցք համայնքի գազաֆիլացման աշխատանքների պայմանագրի մասով առկա են տարբերություններ՝ համայնքի կողմից տրամադրված և փաստացի կատարողական ակտերով տեղադրված խողովակների միջև: Նույն պայմանագրի շրջանակներում աշխատանքների ուշ կատարման համար կապալառուից պետք է պահպեր 590.1 հազ. դրամ գումարով տույժ:

- Փոքր Սեպասար, Մեծ Սեպասար և Կրասար համայնքների գազաֆիկացման աշխատանքների պայմանագրի մասով, համայնքները տրամադրել են գազաֆիկացման համար անհրաժեշտ հենասյունները (ոչ սուանդարտ խողովակներից): Սակայն կապալառուն կատարողական ակտերով **Անրկայացրել է նաև ոչ ստանդարտ խողովակների գնում՝ 931.3 հազ. դրամ գումարի չափով, ինչը վճարվել է ԾԻԳ-ի կողմից:** Առկա են տարբերություններ համայնքի կողմից տրամադրված խողովակների և փաստացի կատարողական ակտերով տեղադրվածի միջև: Կատարողական ակտով կապալառուն ներկայացրել է 165մմ տրամաչափի 63մ խողովակի ձեռքբերում՝ 371.7 հազ. դրամ գումարով, սակայն տեղադրել է ընդամենը 2մ-ը: **Կապալառուին ավելի է վճարվել 359.9 հազ. դրամ:**
- «Պառես Գագ» ՍՊԸ-ին տրամադրված խողովակներից **ԾԻԳ-ին չի վերադարձվել** 63մմ-անոց 432մ, 75մմ-անոց 320մ խողովակ՝ ընդհանուր 923.2 հազ. դրամ ընդհանուր արժեքով, չնայած որ աշխատանքներն արդեն ավարտված են:
- «Հովարմար» ՍՊԸ-ին տրամադրված խողովակներից **ԾԻԳ-ին չի վերադարձվել** 200մմ տրամաչափի 52մ պ/է խողովակ՝ 539.76 հազ. դրամ արժեքով:

3. «Ենթավարկեր»

«Գյուղական Տարածքների Տնտեսական Զարգացման» և «Շուկայավարման հնարավորություն ֆերմերներին» ծրագրերի շրջանակներում «Ենթավարկեր» կատեգորիայով աշխատանքներն իրականացվել են «Գյուղացիական Ֆինանսավորման Կառույց» ԾԻԳ-ՊՀ-ի (այսուհետ՝ ԳՖԿ) կողմից:

Վերահսկող ժամանակահատվածում ԳՖԿ-ին Մասնակից Ֆինանսական Կառույցների (այսուհետ՝ ՄՖԿ¹) կողմից ներկայացվել է 757 հայտ, որոնցից ԳՖԿ-ի կողմից հաստատվել է 752-ը: ԳՖԿ-ի կողմից իրականացվել է ընդհանուր առմամբ 734 հայտի ֆինանսավորում՝ 20,394.77 հազ. ԱՄՆ դոլարի չափով:

ԳՖԿ-ի միջոցով ՄՖԿ-ներին փոխանցված վարկերի մնացորդներն, ըստ բանկերի, 31.12.2011թ. դրությամբ ներկայացված են ստորև բերված աղյուսակում (որից «Շուկայավարման հնարավորություն ֆերմերներին» ծրագրով՝ 2,376.76 հազ. ԱՄՆ դոլար, իսկ «Գյուղական Տարածքների Տնտեսական Զարգացման» ծրագրով՝ 7,315.9 հազ. ԱՄՆ դոլար): ԳՖԿ-ի հաշվիների մնացորդները 31.12.2011թ. դրությամբ կազմել են 3,710. 05 հազ. ԱՄՆ դոլար և 165,939.98 հազ. դրամ:

Աղյուսակ 1

ՄՖԿ կողմից փոխանցված վարկերի մնացորդների վերաբերյալ

¹ առևտրային բանկեր և ֆարկային կազմակերպություններ

Բանկը	Քանակ	Գումար (ԱՄՆ դրամ)	Տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ (%)
Հայրիզմեսբանկ	132	3 943 408.86	31.11
Ակրա-Կրեդիտ Ազրիկոլ Բանկ	7	208 849.88	1.65
Արդյունիմվեստքանկ	188	1 666 522.00	13.15
Անպիրքանկ	40	898 296.93	7.09
Յունիբանկ	27	1 181 030.11	9.32
Արցախբանկ	26	1 742 568.74	13.75
Կոնվերսբանկ	117	1 781 463.04	14.05
Իննկորպանկ	40	1 192 445.55	9.41
Նոր Հորիզոն ՈՒՎԿ	4	5 785.68	0.05
ՍԵՖ Ինտերմեջն ՈՒՎԿ ՍՊԸ	47	32 074.16	0.25
Արեգակ ՈՒՎԿ	13	24 820.19	0.20
Առեքումբանկ	0	0	0
Ընդամենը	641	12,677,265.14	100.00
Մնացորդ շրջանառու ֆոնդ		3,710,047.81	37,342,909.4 դրամ

- Տրամադրված 734 վարկերից ընտրանքային կարգով ուսումնասիրվել է թվով 10 վարկավորման հայտ, որի արդյունքում պարզվել է, որ վարկառուների կողմից ծրագրերի համար ձեռքբերումը հիմնականում իրականացվում է առանց ծախսերը հիմնավորող փաստաթղթերի:
- ՀՀ և ՄՖԿ-ների միջև կնքված փոխառության համաձայնագրերի 4.05 կետի համաձայն, փոխառության միջոցները ՄՖԿ-ի կողմից պետք է տրվեն ենթավարկառուներին ԳՖԿ-ից ստանալուց հետո ոչ ուշ, քան երեք օրվա ընթացքում՝ ենթավարկի տրամադրման վերաբերյալ ծանուցելով ԳՖԿ-ին: Եթե ՄՖԿ-ն չի կարողանում միջոցները տրամադրել վերաբերյալ ժամկետում կամ չի ներկայացնում ենթավարկի տրամադրման վերաբերյալ վճարման հաճանարարականը ԳՖԿ-ին, ապա ՄՖԿ-ն ԳՖԿ-ին պետք է տուգանք վճարի յուրաքանչյուր ուշացված օրվա դիմաց՝ փոխառության գումարի 0.05%-ի չափով: Սույն ալյամանագրի իմաստով ենթավարկառուին ենթավարկի գումարը համարվում է չտրամադրված նաև այն դեպքում, եթե ենթավարկառուի կամ վերջինիս փոխառակցված անձանց տվյալ բանկում ունեցած որևէ բանկային հաշվում (ավանդային, դեպոզիտային, բղթակցային և այլն) 15 օր շարունակ մնում են սույն համաձայնագրի շրջանակներում տրված միջոցները: Փոխառության համաձայնագրերի 5.02 կետի համաձայն, այն դեպքում, եթե ենթավարկառուն սահմանված ժամանակացույցից շուտ է կատարում հիմնական գումարի վճարումները, ապա ՄՖԿ-ն պարտավոր է այդ մասին անմիջապես ծանուցել

ԳՖԿ-ին և վաղաժամկետ վճարված գումարը երեք բանկային օրվա ընթացքում փոխանցել ԳՖԿ-ին։ Իսկ փոխառության համաձայնագրերի 5.09 կետի համաձայն, եթե ՄՖԿ-ն տոկոսի կամ հիմնական գումարի վճարումը չի կատարում համաձայն սահմանված ժամանակացույցի, ՄՖԿ-ն պարտավորվում է ԳՖԿ-ին վճարել տույժ յուրաքանչյուր կետանցված օրվա դիմաց՝ կետանցված գումարի 0.05%-ի չափով։

ՄՖԿ-ներից պահանջվել է տեղեկատվություն՝ վարկառուներին գումարների տրամադրման, վաղաժամկետ մարտուների, տոկոսների և հիմնական գումարների վճարումների վերաբերյալ։ Երեք բանկերից (Արցախբանկ, Ինեկորանկ, Առեքսիմբանկ) ստացված տեղեկատվության համաձայն, ընդհանուր 66 վարկառուների մասով **ՄՖԿ-ների կողմից վարկառուներին գումարների ուշ տրամադրման, վաղաժամկետ մարտուների, տոկոսի և հիմնական գումարների վճարումների սահմանված ժամանակացույցերը խախտելու համար տույժերը կազմում են ընդամենը 5,491.4 ԱՄՆ դոլար։**

Հիմք ընդունելով նշված կետերի դրույթները՝ անհրաժեշտ է բոլոր ՄՖԿ-ներից ստացվելիք տեղեկատվության հիման վրա հաշվարկել և գանձել համապատասխան տույժերը։

4. «Ներդրումներ»

Այս կատեգորիայի շրջանակներում աշխատանքներն իրականացվում են «Հայաստանում գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման հիմնադրամի» (այսուհետ՝ Հիմնադրամ) կողմից: 01.01.2012թ.-ի դրությամբ Հիմնադրամի կողմից կատարվել է 1,483.98 մլն դրամի ծախս՝ IFAD-ի վարկային և դրամաշնորհային, ինչպես նաև դանիական դրամաշնորհային միջոցների (ներառյալ՝ ՀՀ պետական բյուջեի համաֆինանսավորման գումարները) հաշվին։ Սովորական բաժնետոմսերի գնման և փոխառությունների տրամադրման տեսքով ներդրումները 01.01.2012թ. դրությամբ կազմում են 1,063.0 մլն դրամ (Աղյուսակ 2):

Աղյուսակ 2

Հիմնադրամի կողմից իրականացված ներդրումները 01.01.2012թ. դրությամբ

Հնկերությունը	գումարը (հազ. դրամ)	Ներդրման ձևը	Զեղքբերված բաժնետոմսերի տոկոսը
I. «Մեղրու պահածոների գործարան» ՓԲԸ ²	30,000.0	ստորադաս փոխառություն	
«Մեղրու պահածոների գործարան» ՓԲԸ	50,000.0	սովորական բաժնետոմսերի գնում	27.51%

² «Մեղրու պահածոների գործարան» ՓԲԸ-ին փոխառություն տրամադրվել է 40.0 մլն դրամի չափով, որից մինչև բաժնետոմսերի բաժնետոմսերի գնում պայմանագրի ստորագրումը մարվել է 10.0 մլն դրամը։

Ընկերություն	Գումարը (հազ. դրամ)	Ներդրման ծնը	Զեռքբերված բաժնետոմսերի տոկոսը
2.«Չիգ Թաուն» ՓԲԸ	48,000.0	սովորական փոխառություն	
«Չիգ Թաուն» ՓԲԸ	115,000.0	սովորական բաժնետոմսերի գնում	33.26%
3.«Ակվատեխսալտոմատիկա» ՓԲԸ	200,000.0	սովորական բաժնետոմսերի գնում	29.55%
4.«Փյունիկ ՏԹՖ» ՓԲԸ	200,000.0	սովորական բաժնետոմսերի գնում	27.01%
5.«Ազրոլոց» ՓԲԸ	20,000.0	սովորական բաժնետոմսերի գնում	41.86%
6.«365 գրուպ» ՓԲԸ	200,000.0	սովորական բաժնետոմսերի գնում	33.51%
7.«Հարավոր» ՓԲԸ	200,000.0	սովորական բաժնետոմսերի գնում	28.91%
ԸՆԴԱԾՆՆԸ	1,063,000.0		

Ուսումնասիրության արդյունքում պարզվեց, որ՝

- Բաժնետոմսերի բաժանորդագրման պայմանագրերով կողմերը երաշխավորել են, որ ընկերությունները կապահովեն մի շարք նվազագույն հիմնական գործառնական և ֆինանսական ցուցանիշներ, որի արդյունքում պետք է առաջանար համապատասխան շահութաբաժին, որն, ըստ էության, պետք է ավելի մեծ լինի նվազագույն շահութաբաժնի (Եկամտի) գումարից: Սակայն, ընկերությունները չեն ապահովել իրենց և Հիմնադրամի երաշխավորած ցուցանիշները, այսինքն՝ Հիմնադրամը շահութաբաժնի տեսքով ստանում է երաշխավորված շահույրի հաշվարկված և նվազագույն շահութաբաժնի տարբերության չափով պակաս շահութաբաժին (Եկամուտ), ինչը պետք է բացառվի, հակառակ պարագայում, խախտվում է ներդրում կատարելու (շահույր ստանալու) տրամաբանությունը:
- Համապատասխան երաշխավորված ցուցանիշների խախտման պարագայում կստացվի, որ ներդրման փոխարեն կատարվել է տարեկան 15% տոկոսադրույթով վարկավորում կամ ձեռք են բերվել տարեկան 15% տոկոսադրույթով արտոնյալ բաժնետոմսեր:

- «Ակվատեխսալտոմատիկա» ՓԲԸ-ն 2012թ. հունվարի 15-ին պետք է վճարեր 2010թ.-ի համար նվազագույն շահութաբաժինը՝ 30.0 մլն դրամ, սակայն 2012թ. մարտի 1-ի դրույթամբ ընկերության կողմից չի կատարվել վերը նշված պարտավորությունը: Պայմանագրով ընկերությունը պարտավոր է վճարել տույժ՝ յուրաքանչյուր օրվա համար չվճարված գումարի 0.1 տոկոսի չափով (**2012թ. մարտի**

1-ի դրույամբ ենթակա է վճարման շահութաբաժնի գումարը՝ առնվազն **30.0 մլն դրամ և տույժ՝ **1,350.0** հազ դրամ):**

- Բաժնետոմսերի բաժանորդագրման պայմանագրերով հստակ սահմանված են Հիմնադրամի կողմից ներդրվող գումարների ուղղությունները, սակայն Հիմնադրամի կողմից ներկայացված տեղեկատվությունից պարզ դարձավ, որ «Ակվատեխսավտոմատիկա» ՓԲԸ-ն և «Փյունիկ» ՓԲԸ-ն կատարել են այլ ծախսեր՝ խախտելով պայմանագրի համապատասխան պահանջը (օրինակ՝ «Փյունիկ» ՓԲԸ-ի պայմանագրով նախատեսված ճտի տեղափոխման հատուկ բեռնատար ավտոմեքենայի փոխարեն ընկերությունը ճեղք է բերել կերակրման սարք-համալիր):
- «Չիգ Շառուն» ՓԲԸ-ն, փոխառության պայմանագրի համաձայն, 2012թ. հունվարի 15-ին պետք է կատարեր 3,500.0 հազ դրամ փոխառության մարում և 3,124.6 հազ դրամ տոկոսագումարի վճարում, ինչը 01.03.2012թ.-ի դրույամբ չի կատարել, հետևաբար՝ **վերջինիս նկատմամբ պետք է կիրարվեն պայմանագրով սահմանված տույժերն ու սուզանքները՝ 2012թ. մարտի 1-ի դրույամբ՝ 430.6 հազ. դրամ:**
- Ընկերությունները չեն ներկայացնում բաժնետոմսերի բաժանորդագրման պայմանագրերով պահանջվող հաշվապահական հաշվետվությունները:

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

- Թվով 20 օբյեկտների շինարարական աշխատանքների ստուգման արդյունքում արձանագրվել է 53,725.2 հազ. դրամի ծավալային հավելագրում և 51,189.7 հազ. դրամի անորակ աշխատանք:
- Ստուգված օբյեկտների գերակշիռ մասում արձանագրվել են մի շարք խախտումներ՝
 - ✓ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում բացակայում է շինարարության կազմակերպման նախագիծը, նախահաշվային մասերը փորձաքննություն չեն անցել, կոնստրուկտորական գծագրերը կատարվել են թերի՝ բացակայում են կտրվածքները, հանգույցների մանրամասները,
 - ✓ խախտվել են իրավական ակտերով սահմանված մի շարք պահանջներ,
 - ✓ խողովակաշարերի վրա չեն տեղադրվել նախագծով պահանջվող պողպատն ձևավոր մասերը, հեմայունները և խողովակաշարերը ներկված են անորակ, հեմայունների վրա տեղադրվող կիսախողովակի և գազատարի միջև պարանիտե միջադիրները չեն տեղադրվել, տեխնիկական հսկողությունն իրականացվել է թերի, սահմանված կարգի խախտումներով, սահմանված

կարգով պահանջվող հեղինակային հսկողություն օբյեկտներում չի իրականացվել և այլն:

- Ծրագրի շրջանակներում իրականացված գազաֆիկացման աշխատանքների արդյունքում գազաֆիկացումից օգտվում են ընդամենը 4211 տնտեսություն կամ նախատեսվածի 23.1%-ը:
- «Առվա Երկիր» ՍՊԸ-ն շինարարական աշխատանքներն ավարտելուց հետո ԾԻԳ-ին պետք է վերադարձներ 992մ 630մմ տրամաչափի խողովակ, որը չի վերադարձնել: Չվերադարձված խողովակների արժեքը կազմում է 11,408.0 հազ. դրամ:
- 3 պայմանագրերով ձեռքբերված պոլիէթիլենային խողովակների բաշխումը ԾԻԳ-ի կողմից թերի է իրականացվել, ինչի արդյունքում 1062մ խողովակների բաշխումը (2,841.9 հազ. դրամ արժեքով) և գտնվելու վայրը անհայտ է:
- ԾԻԳ-ի և «Վեստ Պլաստ Գ-րուպ» ՍՊԸ-ի միջև կնքված պայմանագրերի շրջանակներում կրկնակի հաշվարկվել է ԱԱՀ՝ ընդհանուր 1,437.5 հազ. դրամ արժեքով, իսկ ուշ մատակարարված ապրանքների համար պետք է կիրառվի ընդհանուր 366.6 հազ. դրամի տույժ:
- «Վեստ Պլաստ Գ-րուպ» ՍՊԸ-ի կողմից ԾԻԳ-ին մատակարարվել է նաև 3720մ մետաղապլաստն խողովակ՝ 1,265.6 հազ. դրամ գումարով: **ԾԻԳ-ում բացակայում է խողովակների բաշխումը՝ պարզ չեն** ում են տրված և որտեղ են տեղադրված:
- ԾԻԳ-ի կողմից մրցութային առաջարկի բանկային երաշխիքը 1,000.0 հազ. դրամի չափով չի պահպել՝ «Արտինմենիրինգ» ՍՊԸ-ի կողմից մրցութային առաջարկից հրաժարվելու արդյունքում:
- Թվով 2 պայմանագրով «Արտինմենիրինգ» ՍՊԸ-ն ԾԻԳ-ին չի վերադարձրել 200մմ տրամաչափի 100մ պ/է խողովակ՝ 1,038.0 հազ. դրամ արժեքով: Մեկ այլ պայմանագրով 200մմ տրամաչափի 65մ խողովակի համար ընկերությանը հավելյալ վճարվել է 1,220.7 հազ. դրամ, որոնց գտնվելու վայրը հայտնի չեն: Անհայտ է նաև ընկերությանը տրամադրված 60մ (200մմ տրամաչափի) և 36մ (160մմ տրամաչափի) խողովակների գտնվելու վայրը՝ 856.8 հազ. դրամ արժեքով:
- «Տրամսգազխն» ՍՊԸ-ի և ԾԻԳ-ի միջև կնքված 2 պայմանագրերով առկա են տարրերություններ՝ համայնքների կողմից տրամադրած և կայալառուների կողմից փաստացի կատարողական ակտերով տեղադրած խողովակների միջև: Բացի այդ, համայնքները պարտավորվել են կապալառուներին տրամադրել անհրաժեշտ հենայուններ, սակայն կապալառուն կատարողական ակտերով ներկայացրել է նույնատիպ խողովակների ձեռքբերում, ինչի դիմաց ԾԻԳ-ը վճարել է 931.3 հազ.

դրամ: Մեկ պայմանագրով ուշ մատակարարված ասրանքների դիմաց պետք է պահի 590.1 հազ. դրամ, մեկ այլ պայմանագրով կապալառուին ավել է վճարվել 359.9 հազ. դրամ:

- «Պատերս Գագ» ՍՊԸ-ին տրամադրված խողովակներից ԾԻԳ-ին չի վերադարձվել 63մմ-անոց 432մ, 75մմ-անոց 320մ խողովակ՝ ընդհանուր 923.2 հազ. դրամ արժեքով, չնայած որ աշխատանքներն արդեն ավարտված են:
- «Հովարմար» ՍՊԸ-ին տրամադրված խողովակներից ԾԻԳ-ին չի վերադարձվել 200մմ տրամաչափի 52մ պ/է խողովակ՝ 539.76 հազ. դրամ արժեքով:
- Տրամադրված ենթավարկերով ծրագրերի ձեռքբերումները վարկառումների կողմից իրականացվում են հիմնականում առանց ծախսերը հիմնավորող փաստաթղթերի:
- Երեք բանկերից ստացված տեղեկատվության համաձայն, ՄՖԿ-ների կողմից վարկառումներին գումարների ուշ տրամադրման, վաղաժամկետ մարտունների, տոկոսի և հիմնական գումարների վճարումների սահմանված ժամանակացույցները խախտելու տույժերը կազմում են ընդհանուր 5491.4 ԱՄՆ դրամ:
- Բաժնետոմսների բաժանորդագրման պայմանագրերով կողմերը երաշխավորել են, որ ընկերությունները կապահովեն մի շարք նվազագույն հիմնական գործառնական և ֆինանսական ցուցանիշներ, որի արդյունքում պետք է առաջանար համապատասխան շահաբաժին, որն ըստ եռթյան պետք է ավելի մեծ լինի նվազագույն շահաբաժնի գումարից: Սակայն ընկերությունները չեն ապահովել իրենց և Հիմնադրամի երաշխավորած ցուցանիշները, այսինքն՝ Հիմնադրամը շահութաբաժնի տեսքով ստանում է երաշխավորված շահույթի հաշվարկված և նվազագույն շահութաբաժնի տարբերության չափով պակաս շահութաբաժին (եկանուտ), ինչը պետք է բացառվի, հակառակ պարագայում խախտվում է ներդրում կատարելու (շահույթ ստանալու) տրամաբանությունը:
- «Ազգատեխսավորմատիկա» ՓԲԸ-ն 2012թ. հունվարի 15-ին պետք է վճարեր 2010թ.-ի համար նվազագույն շահութաբաժննը՝ 30.0 մլն դրամ, սակայն 2012թ. մարտի 1-ի դրությամբ ընկերության կողմից չի կատարվել վերը նշված պարտավորությունը: Պայմանագրով ընկերությունը պարտավոր է վճարել տույժ՝ յուրաքանչյուր օրվա համար չվճարված գումարի 0.1 տոկոսի չափով (2012թ. մարտի 1-ի դրությամբ ենթակա է վճարման շահութաբաժնի գումարը՝ առնվազն 30.0 մլն դրամ և տույժ՝ 1,350.0 հազ դրամ):
- Բաժնետոմսների բաժանորդագրման պայմանագրերով հստակ սահմանված են Հիմնադրամի կողմից ներդրվող գումարների ուղղությունները, սակայն, Հիմնադրամի կողմից ներկայացված տեղեկատվությունից պարզ դարձավ, որ

«Ակվատեխսավտոմատիկա» ՓԲԸ-ն և «Փյունիկ» ՓԲԸ-ն կատարել են այլ ծախսեր՝ խախտելով պայմանագրի համապատասխան պահանջը:

- «Չիգ Թառն» ՓԲԸ-ն, փոխառության պայմանագրի համաձայն, 2012թ. հունվարի 15-ին պետք է կատարեր 3,500.0 հազ դրամ փոխառության մարում և 3,124.6 հազ դրամ տոկոսագումարի վճարում, ինչը 01.03.2012թ.-ի դրությամբ չի կատարել, հետևաբար՝ վերջինիս նկատմամբ պետք է կիրառվեն պայմանագրով սահմանված տույժերն ու տուգանքները՝ 2012թ. մարտի 1-ի դրությամբ՝ 430.6 հազ. դրամ:
- Ընկերությունները չեն ներկայացնում բաժնետոմսերի բաժանորդագրման պայմանագրերով պահանջվող հաշվապահական հաշվետվությունները:

ԱռԱջԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ

ԾԻԳ-իմ՝ Զետնարկել միջոցներ՝

շինարարական աշխատանքների մասով՝

- արձանագրված ծավալային հավելագրումները և անորակ աշխատանքները վերականգնելու ուղղությամբ (ընդհանուր՝ 104,914.9 հազ. դրամ արժեքով),
- շինարարական աշխատանքների իրականացման ընթացքում, ինչպես նաև՝ տեխնիկական և հեղինակային հսկողության ոլորտում իրավական ակտերի պահանջների խախտումները բացառելու ուղղությամբ,
- նախագծային առաջադրանքը մանրակրկիտ, սահմանված կարգին համապատասխան կազմելու ուղղությամբ՝ պարտադիր նշելով օգտագործվող շինարարական նյութերի տեսակը, որակը, ծագումը և այլն,
- գազաֆիկացման ծրագրեր իրականացնելիս դրանցից օգտվելու ցածր ցուցանիշի պատճառները բացահայտելու և ծրագրերի պլանավորման փուլում հետագայում դրանցից օգտվելու հնարավորությունները ճիշտ գնահատելու ուղղությամբ,

ապրանքների մասով՝

- շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո չվերադարձված խողովակները կապալառուների կողմից վերադարձնելու ուղղությամբ (ընդհանուր 13,908.96 հազ. դրամ արժեքով),
- կապալառուների պայմանագրերով կրկնակի ԱԱՀ-ի հաշվառումը բացառելու ուղղությամբ,
- մատակարարներից/կապալառուներից ուշացման տույժերը գանձելու/պահելու ուղղությամբ (ընդհանուր 956.7 հազ. դրամ արժեքով),
- շինարարական աշխատանքների իրականացման համար կապալառուներին տրամադրվող խողովակների բաշխումը պատշաճ կերպով կազմակերպելու, ինչպես

նաև՝ համապատասխան խողովակների (ընդհանուր՝ 6,185.0 հազ. դրամ արժեքով) գտնվելու վայրը ճշտելու ուղղությամբ,

Ենթակարկերի մասով՝

- Վարկառումներին գումարների ուշ տրամադրման, վաղաժամկետ մարումների, տոկոսի և հիմնական գումարների վճարումների սահմանված ժամանակացույցները խախտելու մասով բոլոր ՄՖԿ-ներից (ստացված տեղեկատվության հիման վրա) համապատասխան տույժերը հաշվարկելու և գանձելու ուղղությամբ (3 բանկերից ստացված տեղեկատվության մասով՝ լնդիանուր 5491.4 ԱՄՆ դոլար արժեքով),
Աերոդրոմների մասով՝
- բաժնետոմսերի ծեռքբերման պայմանագրերով երաշխավորված ցուցանիշների ապահովման ուղղությամբ,
- «Ակվատեխսավորմատիկա» և «Չիզ Թաուն» ՓԲԸ-ներից արձանագրված տույժերն ու տուգանքները գանձելու ուղղությամբ (լնդիանուր 1,780.6 հազ. դրամ գումարով),
- շահառու կազմակերպությունների կողմից պայմանագրերով սահմանված ծախսային ուղղությունները պահպանելու ուղղությամբ,
- շահառու կազմակերպությունների կողմից պայմանագրերով նախատեսված հաշվապահական հաշվետվությունները ներկայացնելու ուղղությամբ:
- Հետագայում բաժնետոմսերի ծեռքբերման տեսքով ներդրումներ իրականացնելիս պայմանագրերում սահմանել առավել խրատեսական գործառնական և ֆինանսական ցուցանիշներ:

«ՀՀ Վերահսկիչ պալատի մասին» ՀՀ օրենքի 24-րդ հոդվածի գ) ենթակետի համաձայն, մեկամսյա ժամկետում Վերահսկիչ պալատին տրամադրել գրավոր տեղեկություն՝ հաշվետվությամբ արձանագրված խախտումների վերացման վերաբերյալ:

"ՕՇ" Ծնունդ 2012

N 218/12

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՓՈԽՎԱՐՉԱՊԵՏ
ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ
ՊԱՐՈՆ Ա. ԳԵՎՈՐԳՅԱՆԻՆ


Ի պարագախան Ձեր՝
2012 թ. ապրիլի 27-ի թիվ 01/15/2268-12 գրության

Հարգելի պարոն Գևորգյան,

Կից ներկայացնում ենք ՀՀ Վերահսկիչ պալատի կողմից իրականացված <ԳՏՏԶ
ԾԻԳ> ՊՀ-ի ծրագրերի վերահսկողության արդյունքների և եզրակացության
վերաբերյալ <ԳՏՏԶ ԾԻԳ> ՊՀ-ի մեկնաբանությունները և բացատրությունները:

Հարգանքով՝

Տնօրեն

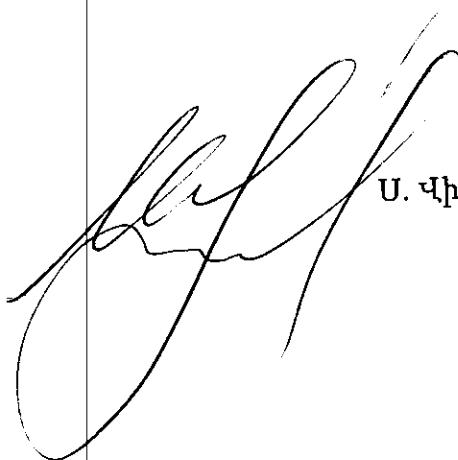

Ս. Վիրաբյան

ՀՅ ՏԻՐԱՎԱԾՈՅՆ ԿԱՂԱՎԱՐՈՒՄ
ԱՆՁՆԱԿԱՐԱՎՈՅ ԱՌԱՋՈՒՆԱԿԱ
ԲԱՐԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲԱԺԻ
ԱՅԼ թշ 4 <u>05/1536.2.12</u>
« <u>07</u> » <u>05</u> 2012 թ.

ՀՅ ՏԻՐԱՎԱԾՈՅՆ ՏՈՐԱՆ ԲԱԺԻ
ԱՆՁՆԱԿԱՐԱՎՈՅ ԱՌԱՋՈՒՆԱԿԱ
ԲԱՐԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲԱԺԻ
ԱՅԼ թշ 218/12
« <u>07</u> » <u>05</u> 2012 թ.

<ԳՏՏԶ ԾԻԳ> ՊՀ-ի մեկնարանությունները և բացատրությունները

Վերահսկիչ պալտափ կողմից կատարված եզրակացություններ	ԾԻԳ-ի մեկնարանություններ և բացատրություններ
<p>Թվով 20 օրյեկտների շինարարական աշխատանքների ստուգման արդյունքում արձանագրվել է 53,725.2 հազ. դրամի ծավալային հավելագրում և 51,189.7 հազ. դրամի անորակ աշխատանք:</p>	<p>Բոլոր շինարարական կազմակերպություններին ուղարկվել են համապատասխան գրություններ սահմանված ժամկետներում հավելագրված գումարները վերադարձնելու և թերությունները վերացնելու նպատակով:</p>
<p>Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում բացակայում է շինարարության կազմակերպման նախագիծը, նախահաշվային մասերը փորձաքննություն չեն անցել, կոնստրուկտորական գծագրերը կատարվել են թերի՝ բացակայում են կորպածքները, հաճգույցների մանրամասները,</p>	<p>Նմանատիպ խնդիրները հետազոտմ բացառելու նպատակով ԾԻԳ-ը ներդնում է ISO 9001:2008 ստանդարտներին համապատասխան կառավարման համակարգ, որը սահմանում է աշխատանքների հսկման և վերահսկման հատակ հոսքագրեր և մեխանիզմներ:</p>
<p>Խախտվել են իրավական ակտերով սահմանված մի շաբթ պահանջներ,</p>	<p>Նմանատիպ խնդիրները բացառելու նպատակով ԾԻԳ-ը ներդնում է ISO 9001:2008 ստանդարտներին համապատասխան կառավարման համակարգ, որը սահմանում է աշխատանքների հսկման և վերահսկման հատակ հոսքագրեր, որոնք հիմնված են համապատասխան օրենսդրական և ենթաօրենսդրական ակտերի վրա:</p>
<p>Խողովակաշարերի վրա չեն տեղադրվել նախագծով պահանջվող պլողատե ձևավոր մասերը, հենասյունները և խողովակաշարերը ներկված են անորակ, հենասյունների վրա տեղադրվող կիսախողովակի և գազատարի միջև պարանիտե միջադիրները չեն տեղադրվել, տեխնիկական հակողությունն իրականացվել է թերի, սահմանված կարգի խախտումներով, սահմանված կարգով պահանջվող</p>	<p>Բոլոր շինարարական կազմակերպություններին ուղարկվել են համապատասխան գրություններ սահմանված ժամկետներում թերությունները վերացնելու նպատակով : Ինչպես արդեն նշվեց նմանատիպ խնդիրները բացառելու նպատակով ԾԻԳ-ը ներդնում է ISO 9001:2008 ստանդարտներին համապատասխան կառավարման համակարգ:</p>

<p>հեղինակային հսկողություն օբյեկտներում չի իրականացվել և այլն:</p>	
<p>Ծրագրի շրջանակներում իրականացված գազաֆիլացման աշխատանքների արդյունքում գազաֆիլացումից օգտվում են ընդամենը 4211 տնտեսություն կամ նախատեսվածի 23.1%-ը:</p>	<p>ԾԻԳ-ի մոնիթորինի և գնահատման մասնագետը կատարում է հատուկ ուսումնասիրություն, որի նպատակն է վեր հանել ցածր ցուցանիշի պատճառները և ճիշտ գնահատել զարդ օգտագործման արդյունավետությունը:</p>
<p>«Առվա Երկիր» ՍՊԸ-ն շինարարական աշխատանքներն ավարտելուց հետո ԾԻԳ-ին պետք է վերադարձներ 992մ 630նմ տրամաչափի խողովակ, որը չի վերադարձնել: Չվերադարձված խողովակների արժեքը կազմում է 11,408.0 հազ. դրամ:</p>	<p>Ներկայումս կատարվում է օբյեկտի ընդունում և հանձնում, որից հետո կհատկեցվի վերադարձվող խողովակների ծավալը:</p>
<p>3 պայմանագրերով ձեռքբերված պրոյեկտինային խողովակների բաշխումը ԾԻԳ-ի կողմից թերի է իրականացվել, ինչի արդյունքում 1062մ խողովակների բաշխումը (2,841.9 հազ. դրամ արժեքով) և գտնվելու վայրը անհայտ է:</p>	<p>ԾԻԳ-ը գրություններ է ուղարկել նշված պայմանագրերի շրջանակներում աշխատանքները համակարգող նախկին աշխատակիցներին համապատասխան տեղեկատվություն ստանալու և հետագա քայլերը սահմանելու նպատակով:</p>
<p>ԾԻԳ-ի և «Վեստ Պլատ Գրուպ» ՍՊԸ-ի միջև կնքված պայմանագրերի շրջանակներում կրկնակի հաշվարկվել է ԱԱՀ՝ ընդհանուր 1,437.5 հազ. դրամ արժեքով, իսկ ոչ մատակարարված ապրանքների համար պետք է կիրառվի ընդհանուր 366.6 հազ. դրամի տույժ:</p>	<p>Համապատասխան գրություն կուղարկվի նշված կազմակերպություն տեղեկատվությունը ճշտելու նպատակով, քանի որ հստակ չէ, որ տվյալ գումարը գոյացել է ԱԱՀ-ի կրկնարկի հաշվարկի արդյունքում:</p> <p>Հարցը հստակեցնելուց հետո կձեռնարկվեն համապատասխան քայլեր: ԾԻԳ-ի կողմից ներդրվող կառավարման համակարգի շնորհիվ հնարավոր կլինի</p>

	հետազայում բացառել նման խնդիրների առաջացումը:
«Վեստ Պլաստ Գրուպ» ՍՊԸ-ի կողմից ԾԻԳ-ին մատակարարվել է նաև 3720մ մետաղապլաստե խողովակ՝ 1,265.6 հազ. դրամ գումարով: ԾԻԳ-ում բացակայում է խողովակների բաշխումը՝ պարզ չե՝ ում են տրված և որտեղ են տեղադրված:	ԾԻԳ-ը գրություններ է ուղարկել նշված պայտմագրերի շրջանակներում աշխատանքները համակարգող նախկին աշխատակիցներին համապատասխան տեղեկատվություն ստանալու և հետազա քայլերը սահմանելու նպատակով:
ԾԻԳ-ի կողմից մրցութային առաջարկի բանկային երաշխիքը 1,000.0 հազ. դրամի չափով չի պահպել՝ «Արտինժենիրինգ» ՍՊԸ-ի կողմից մրցութային առաջարկից երաժարվելու արդյունքում:	Խսկապես նման խնդիր կա, սակայն ԾԻԳ-ի իրավաբանները հավաստում են, որ խնդրի վաղեմության ժամկետն անցել է և հեարակոր չէ որևէ քայլ ձեռնարկել:
Թվով 2 պայմանագրով «Արտինժենիրինգ» ՍՊԸ-ն ԾԻԳ-ին չի վերադարձրել 200մմ տրամաչափի 100մ պ/տ խողովակ՝ 1,038.0 հազ. դրամ արժեքով: Մեկ այլ պայմանագրով 200մմ տրամաչափի 65մ խողովակի համար ընկերությանը հավելյալ վճարվել է 1,220.7 հազ. դրամ, որոնց գտնվելու վայրը հայտնի չէ: Անհայտ է նաև ընկերությանը տրամադրված 60մ (200մմ տրամաչափի) և 36մ (160մմ տրամաչափի) խողովակների գտնվելու վայրը՝ 856.8 հազ. դրամ արժեքով:	Ներկայում աշխատանքներ են տարվում ԾԻԳ-ի կողմից: Համապատասխան գրություններ են ուղարկվել նշված կազմակերպություն խնդիրը հստակեցնելու և լուծելու նպատակով:
«Տրանսգազխն» ՍՊԸ-ի և ԾԻԳ-ի միջև կնքված 2 պայմանագրերով առկա են տարբերություններ՝ համայնքների կողմից տրամադրած և կապալառուների կողմից փաստացի կատարողական ակտերով տեղադրած խողովակների միջև:	Համաձայն պայմանագրի աշխատանքների սկիզբ է համարվում 21.04.2009թ., աշխատանքների տևողությունը կազմում է 300 օր, ավարտը՝ 21.02.2010թ. Կառույցի

<p>Բացի այդ, համայնքները պարտավորվել են կապալառուներին տրանսպորտի անհրաժեշտ հեմասյուներ, սակայն կապալառուն կատարողական ակտերով ներկայացրել է նույնատիպ խողովակների ծեռքբերում, ինչի դիմաց ԾԻԳ-ը վճարել է 931.3 հազ. դրամ: Մեկ պայմանագրով ուշ մատակարարված ապրանքների դիմաց պետք է պահվի 590.1 հազ. դրամ, մեկ այլ պայմանագրով կապալառուին ավել է վճարվել 359.9 հազ. դրամ:</p>	<p>փաստացի ավարտը տեղի է ունեցել 30.10.2009թ., այսինքն աշխատանքների սկզբից հաշված 190 օրվա ընթացքում: Կից ներկայացվում են շինարարության թույլտվությունը և աշխատանքների ավարտման վկայագրի պատճենները:</p> <p>Համապատասխան գրություն կուղարկվի տվյալ կազմակերպությանը և համայնքին՝ փոխադարձ ակտերի և համապատասխան փաստաթղթերի համաձայն խնդիրը հստակեցնելու և լուծելու նպատակով:</p>
<p>«Պառեր Գագ» ՍՊԸ-ին տրամադրված խողովակներից ԾԻԳ-ին չի վերադարձվել 63մմ-անոց 432մ, 75մմ-անոց 320մ խողովակ՝ ընդհանուր 923.2 հազ. դրամ արժեքով, չնայած որ աշխատանքներն արդեն ավարտված են:</p>	<p>Խողովակներն արդեն վերադարձված են:</p>
<p>«Հովարմար» ՍՊԸ-ին տրամադրված խողովակներից ԾԻԳ-ին չի վերադարձվել 200մմ տրամաչափի 52մ պ/է խողովակ՝ 539.76 հազ. դրամ արժեքով:</p>	<p>Ներկայումս աշխատանքներ են տարվում ԾԻԳ-ի կողմից հարցը հստակեցնելու նպատակով:</p>
<p>Տրամադրված ենթավարկերով ծրագրերի ծեռքբերումները վարկառուների կողմից իրականացվում են հիմնականում առանց ծախսերը հիմնավորող փաստաթղթերի:</p>	<p>Փոխառության համաձայնագրերում և ներդրումային ուղեցույցում ծախսերը հիմնավորող փաստաթղթեր ներկայացնելու պահանջ չկա: Նշենք, որ կատարվում է վարկերի նպատակայնության մոնիթորինգ, որի ընթացքում վեր են հանվում վարկի հետ կապված բոլոր խնդիրները:</p>
<p>Երեք բանկերից ստացված տեղեկատվության համաձայն, ՍՖԿ-ների կողմից</p>	<p>Երեք բանկերից ստացած տեղեկատվության համաձայն տվյալ բանկերի</p>

<p>Վարկառության գումարների ուշ տրամադրման, վաղաժամկետ մարտուների, տոկոսի և հիմնական գումարների վճարումների սահմանված ժամանակացույցները խախտելու տույժերը կազմում են ընդհանուր 5491.4 ԱՄՆ դոլար:</p>	<p>Տույժերը կազմել են 4969,69. ԳՖԿ աշխատակիցների կողմից ուսումնասիրվել են մնացած ՄՖԿ-ներից ստացված տեղեկություններ, հաշվարկվել են տույժերը և պահանջվել վերջիններից տույժերը վճարել ամբողջությամբ:</p>
<p>Բաժնետոմսների բաժանորդագրման պայմանագրերով կողմերը երաշխավորել են, որ ընկերությունները կապահովեն մի շարք նվազագույն հիմնական գործառնական և ֆինանսական ցուցանիշներ, որի արդյունքում պետք է առաջանար համապատասխան շահարաժեխն, որն ըստ եռթյան պետք է ավելի մեծ լինի նվազագույն շահարաժեխնի գումարից: Սակայն ընկերությունները չեն ապահովել իրենց և Հիմնադրամի երաշխավորած ցուցանիշները, այսինքն՝ Հիմնադրամը շահութարաժեխնի տեսքով ստանում է երաշխավորված շահույթի հաշվարկված և նվազագույն շահութարաժեխնի տարբերության շափով պակաս շահութարաժեխն (եկամուտ), ինչը պետք է բացառվի, հակառակ պարագայում խախտվում է ներդրում կատարելու (շահույթ ստանալու) տրամարանությունը:</p>	<p>Համաձայն «Հայաստանում գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման հիմնադրամի կողմից 04.05.2012թ ստացված գրությանը Հիմնադրամը իր մեկնաբանությունները և բացատրությունները կներկայացնի վեր հանված խնդիրները Հիմնադրամի Հոգաբարձուների խորհրդի քննարկումից հետո:</p>
<p>«Ակվատեխսավտոմատիկա» ՓԲԸ-ն 2012թ. հունվարի 15-ին պետք է վճարեր 2010թ.-ի համար նվազագույն շահութարաժեխնը՝ 30.0 մլն դրամ, սակայն 2012թ. մարտի 1-ի դրությամբ ընկերության կողմից չի կատարվել վերը նշված սպարտավիրությունը: Պայմանագրով ընկերությունը պարտավոր է վճարել տույժ՝ յուրաքանչյուր օրվա համար շվճարված գումարի 0.1 տոկոսի շափով (2012թ. մարտի 1-ի դրությամբ ենթակա է վճարման շահութարաժեխնի գումարը՝ առնվազն 30.0 մլն դրամ և տույժ՝ 1,350.0 հազ դրամ):</p>	

<p>Քաժնետոմսերի քաժանորդագրման պայմանագրերով հատակ սահմանված են Հիմնադրամի կողմից ներդրվող գումարների ուղղությունները, սակայն, Հիմնադրամի կողմից ներկայացված տեղեկատվություննից պարզ դարձավ, որ «Ակվատեխավտոմատիկա» ՓԲԸ-ն և «Փյունիկ» ՓԲԸ-ն կատարել են այլ ծախսեր՝ խախտելով պայմանագրի համապատասխան պահանջը:</p>	
<p>«Զիգ Թաուն» ՓԲԸ-ն, փոխառության պայմանագրի համաձայն, 2012թ. հունվարի 15-ին պետք է կատարել 3,500.0 հազ. դրամ փոխառության մարտն և 3,124.6 հազ. դրամ տոկոսագումարի վճարում, ինչը 01.03.2012թ.-ի դրությամբ չի կատարել, հետևաբար՝ վերջինիս նկատմամբ պետք է կիրառվեն պայմանագրով սահմանված տույժերն ու սուզանքները՝ 2012թ. մարտի 1-ի դրությամբ՝ 430.6 հազ. դրամ:</p>	
<p>Ընկերությունները չեն ներկայացնում քաժնետոմսերի քաժանորդագրման պայմանագրերով պահանջվող հաշվապահական հաշվետվությունները:</p>	



ՁԼՆ 3

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

«ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի գյուղապետարան

(նարզը, տեղական ինքնակառավարման մարմինը)

ՕՒՍՏՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ Նո. _____

«21 » 04 2009թ.

Տրված է **«Գյուղական լուսավորության տնտեսական գարգարացման ԾՎԿԳ» ՊՐԵՄԻ**

ի դեմք տնօրեն՝ Գ.Ա.Արևոյանի 54-28-84

(Հայոց ազգային պատումը, ազգանումը, անումը, հողանախացեն)

(անբողջ օրենսդրության շինուածածյան կամ վերակառուցման

«ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի գազաժիկացում»

կատարման համար

ուժացման, արդիականացման, վերականգնման աշխատանքները)

այդ թվում գյուղական հատակագծի վրա նշված

(օժանդակն ոչ ինքնական կառայցների ամփանումները)

Նախագծային լիաստաբրդերը մշակված են

«Նայութևազարդ» ՓԲԸ

«ՀԱՅՄԵՏՐԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» մասնաճյուղի

կողմից

Ծինարարության վարման մատյանը բաղկացած է 32 էջից, կարգած և գրոշմակնքված:

«Գյուղական լուսավորության տնտեսական գարգարացման ԾՎԿԳ» ՊՐԵՄԻ

կողմից

Նախատեսվում է շինարարական աշխատանքներն իրականացնել:

(նախագծային լիաստաբրդերում նշված

300 օր

ընթացքում

շինարարության անլուգությունը)

Նախագծային լուծումները սահմանված կարգով փոփոխվել են

(լրացվում է կարգի 19-րդ կետում նշված դեպքերում)

(նախագծային աշխատանքների կապավորությունը)

կողմից

ամփանումը, որնը պահմանված դեպքերում լիցենզիաների No.№.-ները)

Ցատուկ պայմաններ՝

1. Կարգությունը նախքան շինարարությունն սկսելը պարտավոր է փոխհատուցել այն անձանց համար, որոնց փոփոխությունները սահմանափակվում են շինարարության ընթացքում:



Արմեն Հայրակ
(Հայոց ազգային պատումը)

Հայրակ Հայրակ
(անհետ, ազգանումը)

N^o 01 / 50 - 12
«» 2012թ.

Հարգելի պարունակած նշանակած տարածքների տնտեսական զարգացման Ծիգ» ՊՀ տնօրենին
պարուն Ս. Վիրաբյանին

Հարգելի պարունակած նշանակած տարածքների տնտեսական զարգացման Ծիգ» ՊՀ տնօրենին
պարուն Ս. Վիրաբյանին

Ի լրումն 19 մարտի 2012թ. թիվ 01/33-12 գրության հայտնում ենք Ձեզ, որ ՀՀ Վերահսկիչ պալատի կողմից իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ Հայաստանի զյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման հիմնադրամի հատուկ կարծիքը և առարկությունները կրնարկվեն ՀԳՏՏԶՀ Հոգաբարձուների խորհրդի կայանալիք առաջիկա նիստում, իսկ վերջիններիս հետ կատարված վերացման միջացառումների վերաբերյալ տեղեկատվությունը կներկայացվի ՀԳՏՏԶՀ Հոգաբարձուների խորհրդի հետ քննարկման արդյունքներով:

Հարգանքով՝

Տնօրեն

S. Խանիկյան

142

04 05 12

N 41/13

«30» 01 2013 p.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
ՊԱՐՈՆ ԴԱՎԻԹ ՍԱՐԳՍՅԱՆԻՆ

Հարգելի պարոն Սարգսյան,



Ի կատարումն Ձեր 23.01.2013 թվականի №.02/23.16/795-13 հանձնարարականի, ներկայացնում եմ տեղեկատվություն՝ ՀՀ վերահսկիչ պալատի կողմից արձանագրված խախտումների վերացման ուղղությամբ իրականացված միջոցառումների վերաբերյալ:

Առղիք 5 էջ:

Հարգանքով՝

Տնօրեն

Սերգեյ Վիրաբյան

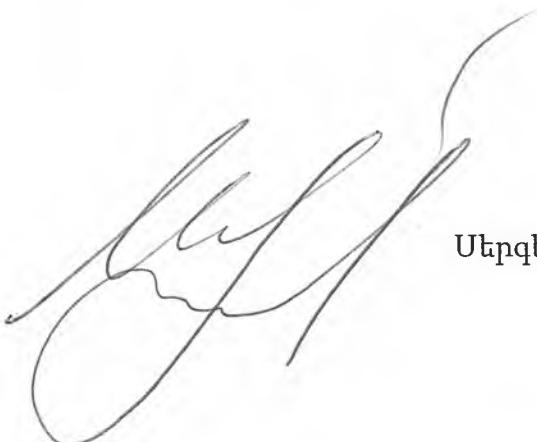

Վերականգնման ընթացք առ 31.12.2012թ.

Գյուղատնտեսական տարածքների տնտեսական զարգացման ԾԻԳ

(հազ. դրամ)

Հ/Հ	Արձանագրված խախտում		Վերականգնված/Մարված		Դեռևս ենթակա է վերականգնման	Վերականգնված առ 31.12.2012	Նշումներ
	Կազմակերպություն	գումարը	ՀՀ վերահսկիչ պալատի կողմից արձանագրված վերականգնման ենթակա խախտումներ	գումարով	աշխատանքով		
Հիմնանորոգում և շինարարական աշխատանքներ							
1	«Պառես-Գազ» ՍՊԸ	10,000.0	10,000.0	2,000.0	8,000.0	0.0	առ 31.12.12 2000.0 հազ դրամը մարվել է համաձայն <Պառես-Գազ> ՍՊԸ-ի հետ 15.06.2012թ-ին կնքված փոխադարձ հաշվարկների վերաբերյալ ակտի
2	«ՀՈՎԱՐՄԱՐ» ՍՊԸ	7,562.3	7,562.3	0.0	7,562.3	0.0	առ 31.12.12 Թերությունները վերացված են /հիմք՝ արձանագրություն առ 17.07.2012թ - Գ.Տ.Տ.ԾԻԳ ՊՀ և Հովարմար ՍՊԸ-ի միջև/:
3	N1 «Շինվարչություն» ԲԲԸ	1,144.2	1,144.2	227.8	916.4	0.0	առ 31.12.12 227.8 հազ դրամը մարվել է համաձայն <N.1 Շինվարչություն> ԲԲԸ-ի հետ 31.08.2012թ-ին կնքված փոխադարձ հաշվարկների մետարերան ակտի
4	«Սուրհամ» ՍՊԸ	32,193.4	32,193.4	0.0	0.0	32,193.4	առ 31.12.12 Սուրհամ ՍՊԸ-ի գործը գտնվում է ՀՀ գլխավոր դատախազությունում
5	«Առվա Երկիր» ՍՊԸ	11,266.1	11,266.1	662.4	10,603.7	0.0	առ 31.12.12 662.4 հազ դրամը մարվել է համաձայն <Առվա Երկիր> ՍՊԸ-ի հետ 25.06.2012թ-ին կնքված փոխադարձ հաշվարկների վերաբերյալ ակտի

6	«Գագկոմ Հին» ՍՊԸ	8,105.0	8,105.0	1,295.1	6,809.9	0.0	առ 31.12.12	1295.1 հազ դրամը մարվել է համաձայն <Գագկոմշին> ՍՊԸ-ի հետ 21.05.2012թ-ին կնքված փոխադարձ հաշվարկների վերաբերյալ ակտի
7	«Ստելսշին» ՍՊԸ	3,209.7	3,209.7	633.0	2,576.7	0.0	առ 31.12.12	633.0 հազ դրամը մարվել է համաձայն <Ստելսշին> ՍՊԸ-ի հետ 16.10.2012թ-ին կնքված փոխադարձ հաշվարկների վերաբերյալ ակտի
8	«Սաղարելյան Եղբայրներ» ՍՊԸ	4,270.5	4,270.5	0.0	4,270.5	0.0	առ 31.12.12	Թերությունները վերացված են /հիմք. արձանագրություն առ 16.08.2012թ - ԳՏՏԶ ԾԻԳ ՊՀ և Սաղարելյան Եղբայրներ ՍՊԸ-ի միջև/:
9	«Արտինժեներինգ» ՍՊԸ	5,224.0	5,224.0	0.0	5,224.0	0.0	առ 31.12.12	Թերությունները վերացված են /հիմք. արձանագրություն առ 07.12.2012թ - ԳՏՏԶ ԾԻԳ ՊՀ և Արտինժեներինգ ՍՊԸ-ի միջև/:
10	«Մերքա» ՍՊԸ	8,029.3	8,029.3	0.0	0.0	8,029.3	առ 31.12.12	Մերքա ՍՊԸ-ի գործը գտնվում է ՀՀ զիսավոր դատավայագությունում
11	«Սանլորետ» ՍՊԸ	2,667.6	2,667.6	797.3	1,870.3	0.0	առ 31.12.12	797.3 հազ դրամը մարվել է համաձայն <Սանլորետ> ՍՊԸ-ի հետ 16.10.2012թ-ին կնքված փոխադարձ հաշվարկների վերաբերյալ ակտի
12	«Շինարար-10» ՀԶ ՍՊԸ	2,011.0	2,011.0	0.0	2,011.0	0.0	առ 31.12.12	Թերությունները վերացված են /հիմք. արձանագրություն առ 14.07.2012թ - ԳՏՏԶ ԾԻԳ ՊՀ և «Շինարար-10» ՍՊԸ-ի միջև/:
13	«Մ.Ա.Դ. Շինանյութ» ՍՊԸ	2,616.0	2,616.0	718.3	1,897.7	0.0	առ 31.12.12	718.3 հազ դրամը մարվել է համաձայն <Մ.Ա.Դ. Շինանյութ> ՍՊԸ-ի հետ 15.06.2012թ-ին կնքված փոխադարձ հաշվարկների վերաբերյալ ակտի

14	«Վահե - Սանե» ՍՊԸ	3,986.5	3,986.5	0.0	3,986.5	0.0	առ 31.12.12	Թերությունները վերացված են /հիմք. արձանագրություն առ 01.08.2012թ - ԳՏՏԶ ԾԻԳ ՊՀ և «Վահե-Սանե» ՍՊԸ-ի միջև/:
15	«Նաոմիշ» ՍՊԸ	2,629.3	2,629.3	143.8	2,485.5	0.0	առ 31.12.12	143.8 հազ դրամը մարվել է համաձայն <Նաոմիշ> ՍՊԸ-ի հետ 16.10.2012թ-ին կնքված փոխադարձ հաշվարկների վերաբերյալ ակտի
Ընդամենը 1		104,914.9	104,914.9	6,477.7	58,214.5	40,222.7		
16	Չվերադարձված խողովակների գումար, այդ թվում	13,909.0	13,909.0	2,208.0	11,701.0	0.0	31.12.12	
16ա	«Առվա Երկիր» ՍՊԸ	11,408.0	11,408.0	2,208.0	9,200.0	0.0	առ 31.12.12	2208.0 հազ դրամը մարվել է համաձայն <Առվա Երկիր> ՍՊԸ-ի հետ 25.06.2012թ-ին կնքված փոխադարձ հաշվարկների վերաբերյալ ակտի
16բ	«Արտիմժեներիմզ» ՍՊԸ	1,038.0	1,038.0	0.0	1,038.0	0.0	առ 31.12.12	հիմք. Գրություն Արտիմժեներիմզ ՍՊԸ-ից տեղադրված խողովակների վերաբերյալ
16գ	«Պառերս-Գագ» ՍՊԸ	923.2	923.2	0.0	923.2	0.0	առ 31.12.12	հիմք. Հանձնման-Ընդունման ակտ առ 22.03.2012թ
16դ	«ՀՈՎԱՐՄԱՐ» ՍՊԸ	539.8	539.8	0.0	539.8	0.0	առ 31.12.12	<Հովարմար> ՍՊԸ-ի կողմից 200մմ տրամաչափի խողովակները 52մ երկարությամբ վերադարձվել են ԳՏՏԶ ԾԻԳ ՊՀ-ին համաձայն 01.08.2012թ ակտի
17	Չհայտնաբերված խողովակների գումար, այդ թվում	6,185.0	6,185.0	0.0	6,185.0	0.0	31.12.12	
17ա	Արշանդ ՍՊԸ, Արամիր ՍՊԸ, Վեստ Պլատ գրուպ ՍՊԸ	2,841.9	2,841.9	0.0	2,841.9	0.0	առ 31.12.12	հիմք. Գրություն Արշանդ ՍՊԸ-ից առ 19.06.2012 խողովակների հանձնման վերաբերյալ

17р	Վեստ Պլաստ Գրուպ ՍՊԸ	1,265.6	1,265.6	0.0	1,265.6	0.0	առ 31.12.12	1265.6 հազ դրամը մարվել է համաձայն <Վեստ Պլաստ Գրուպ> ՍՊԸ-ի հետ 31.08.2012թ-ին կնքված փոխադարձ հաշվարկների վերաբերյալ աևտի
17գ	«Արտիմժեներինգ» ՍՊԸ	1,220.7	1,220.7	0.0	1,220.7	0.0	առ 31.12.12	հիմք. Հանձնման-Ընդունման աևտ առ 22.10.2012թ
17դ	«Արտիմժեներինգ» ՍՊԸ	856.8	856.8	0.0	856.8	0.0	առ 31.12.12	հիմք. Հանձնման-Ընդունման աևտ առ 22.10.2012թ
18	Մատակարարման կամ աշխատանքների ուղացման տույժեր, սյու թվում	41,542.0	41,542.0	37,192.7	366.6	3,982.7	31.12.12	
18ա	Վեստ Պլաստ Գրուպ ՍՊԸ	366.6	366.6	0.0	366.6	0.0	առ 31.12.12	366.6 հազ դրամը մարվել է համաձայն <Վեստ Պլաստ Գրուպ> ՍՊԸ-ի հետ 31.08.2012թ-ին կնքված փոխադարձ հաշվարկների վերաբերյալ աևտի
*18բ	Տրանսզագշին ՍՊԸ	590.1	590.1	0.0	0.0	590.1	առ 31.12.12	Ըստ փոփոխված պատվերի սահմանված ժամկետի՝ 03.10.2009թ., օրյեկտը հանձնվել է ժամկետից շուտ՝ 21.02.2010թ. Խախտում տեղի չի ունեցել
**19	Պայմանագրով նախատեսված տույժերի գումար 5,491.4 ԱՄՆ դոլար	2,042.6	2,042.6	0.0	0.0	2,042.6	առ 31.12.12	ԳԶՍՀ-ն չի թույլատրում 5491.4 ԱՄՆ դոլարի չափով տույժերի գործընթաց սկսելուն (հիմք. ԳԶՍՀ Հուշագիր, Սայիս 2012):
***20	«Ակվատեխնավոլմատիկա» ՓԲԸ համար ՀԳՏՏԶՀ շահարաժեն: «Ակվատեխնավոլմատիկա» ՓԲԸ նկատմամբ Վերահսկիչ պահատի կողմից հաշվարկված տույժի վերաբերյալ ՀԳՏՏԶՀ-ն կը նարկի Հոգաբարձուների խորհրդի մտավա նիստի բնագրում՝ մինչև 15.09.2012թ.:	31,487.5	31,487.5	30,137.5	0.0	1,350.0	առ 31.12.12	«Ակվատեխնավոլմատիկա» ՓԲԸ -ն վճարել է 2010թ. համար ՀԳՏՏԶՀ շահարաժեն: «Ակվատեխնավոլմատիկա» ՓԲԸ նկատմամբ Վերահսկիչ պահատի կողմից հաշվարկված տույժի վերաբերյալ ՀԳՏՏԶՀ-ն կը նարկի Հոգաբարձուների խորհրդի մտավա նիստի բնագրում՝ մինչև 15.09.2012թ.:

21	«Զիգ Թաուն» ՓԲԸ 3,500.0 հազ. դրամ փոխառության մարման , 3,124.6 հազ. դրամ տոկոսի և 430.6 հազ. դրամ տույժերի գումար	7,055.2	7,055.2	7,055.2	0.0	0.0	առ 31.12.12	«Զիգ Թաուն» ՓԲԸ կատարել է փոխառության պայմանագրով ստանձնած ողջ պարտավորությունը: Վերջինիս կողմից ճարվել է փոխառության գումարը 48 մլն ՀՀ դրամ, հաշվարկված տոկոս, տույժ և տուգանք համապատասխանաբար՝ 5507506,85, 993 690,41 և 132492,05 ՀՀ դրամ գումարի չափով:
	Ընդամենը 2	61,636.0	61,636.0	39,400.7	18,252.6	3,982.7		
	ԸՆԴԱՄԵՆՔ (1+2)	166,550.9	166,550.9	45,878.4	76,467.1	44,205.4		

*18p Թիվ FMAP/LCB/CW/-2009/026/GAS պայմանագրով ըստ վերահսկիչ պալատի հաշվետվության աշխատանքների ուշացման համար (17օր) պետք է պահպեր 590100 ՀՀ դրամ տույժի գումարը: Ըստ փոփոխված պատվերի սահմանված ժամկետի՝ 03.10.2009թ., օրեւէտը եանձնվել է ժամկետից շուտ՝ 21.02.2010թ.. Խախտում տեղի չի ունեցել:

**19 ԳԶՍՀ-ն չի թույլատրում 5491.4 ԱՄՆ դոլարի չափով տույժերի գործընթաց սկսելուն (հիմք ԳԶՍՀ Հուշագիր, Մայիս 2012):

***20 «Ակվատեխսավտոմատիկա» ՓԲԸ -ն վճարել է 2010թ. համար ՀԳՏՏԶՀ շահաբաժնը: «Ակվատեխսավտոմատիկա» ՓԲԸ նկատմամբ Վերահսկիչ պալատի կողմից հաշվարկված տույժի վերաբերյալ ՀԳՏՏԶՀ-ի Հոգարածուների խորհուրդի որոշմամբ 1350.0 հազ դրամի չափով տույժ չկիրառել (հիմք. ՀԳՏՏԶՀ խորհրդի Արձանագրություն No23.8/139391-12 առ 28.11.2012թ.)

Ֆինանսահաշվային բաժնի պետ

Ա. Սուսարիկյան

Շինարարության վերահսկման բաժնի պետ

Հ. Բագիրյան

Շինարարության վերահսկման ճարտարագետ

Նախագծման վերահսկման ճարտարագետ
